

Linie: SBB 720 SOB 670 12.601.08

Bezeichnung: Zürich - Ziegelbrücke Wädenswil – Einsiedeln

km: 22.2 - 25.9 0.0 - 1.1

Kantone: Zürich, Schwyz


Gemeinden: Wädenswil, Richterswil, Freienbach

Projekt: AS35; Wädenswil
Publikumsanlage

ISP-Nr. 1161158

Phase: Auflageprojekt

Übersichtsplan:

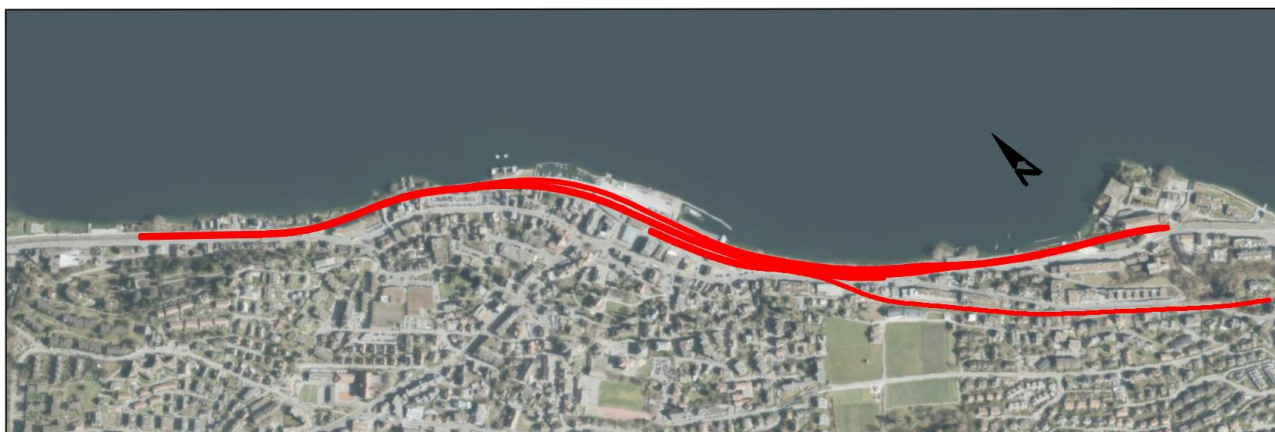

Autoren: Bauherrenvertretung SBB
Abteilung/OE: I-AEP-PJM-ROT-T4
Name: René Batschelet
Datum: 08.06.2026
Unterschrift:

Projektverfasser
Firma: PGBW
Name: Pascal Guignard
Datum: 08.06.2026
Unterschrift:



SBB CFF FFS

Stellungnahme zu Prüfbericht

Perrondächer

Linie: 720 km: 23.806 – 24.178

SBB, Infrastruktur

Vulkanplatz 11, 8048 Zürich

Dok. Nr.

WAE_BP_12.601.08_IB_SV-BERI-STN_Perrondach_GRU_C00

Index	Erstellt	Vis.	Geprüft	Vis.	Freigab	Vis.
C00	02.05.2025	TRMA	02.05.2025	GUPA	02.05.2025	MR

Filename: WAE_BP_12.601.08_IB_SV-BERI-STN_Perrondach GRU_C00.docx

Format: A4

Erstellt auf Basisdaten der amtlichen Vermessung und der SBB-Geodaten © swisstopo
© Alle Rechte an diesem Dokument stehen der SBB zu.
Für die genaue Lage und die Vollständigkeit der unterirdischen Anlagen besteht kein
Gewähr.

Impressum

Version- und Änderungsjournal

Version	Beschrieb / Änderungen gegenüber Vorgängerversion	erstellt	geprüft	freigegeben
C00	PGV-Dossier	02.05.2025/TRM	02.05.2025/GUP	02.05.2025/MR

Autorenteam

Verantwortlicher Ersteller, Gesamtprojektleiter		Projektverfasser
René Batschelet SBB Infrastruktur, Ausbau- und Erneuerungsprojekte Vulkanplatz 11 8048 Zürich Tel: 079 523 23 55 rene.batschelet@sbb.ch		Pascal Guignard Gruner AG, c/o Planergemeinschaft PGBW Thurgauerstrasse 80 8050 Zürich Tel: 079 309 63 44 Pascal.guignard@gruner.ch
Fachbereich	Name	Organisationseinheit
Projektleitung	Batschelet René	I-AEP-PJM-ROT-T4
Oberbauleitung	Román Isabel	I-AEP-PJM-ROT-T4
Geomatik	Ganz Michael	I-AEP-ENG-GEO-ROT
Fahrbahn	Aebi Patrick	I-AEP-ENG-FB-ROT-PL1
Ingenieurbau Tiefbau	Rutz Matthias	I-AEP-PJM-ROT-T4
Ingenieurbau Tragkonstruktion	Rutz Matthias	I-AEP-PJM-ROT-T4
Architektur, Bahnzugang	Glauser Thomas	I-AEP-ENG-BZT-ROT-BAT
Technische Anlagen	Galli Yanick	I-AEP-ENG-BZT-ROT-TA
HLK	Divrikli Ismail	I-AEP-ENG-BZT-ROT-TA
Sicherungsanlagen	Oberholzer Roland	I-AEP-ENG-FS-ROT-PL3
Leittechnik	Tresch Michael	I-AEP-SAZ-ROT-LTT
Fahrstrom	Novak Marijo	I-AEP-ENG-FS-ROT-PL3
Kabel	Dommen Thomas	I-AEP-ENG-KAB-ROT-PL
Telecom	Hilfiker Marcel	I-NAT-TC-TPP-ROT
Umwelt	Tresch Eliane	I-AEP-ENG-UMW-ROT
Land- und Rechterwerb	Kerschbaumer Petra	IM-GM-GBB-ROT
IM Bahnhofsmanagement	Fiore Carolina	IM-BW-MPA-RO1
Projektverfassende	Name	Firma
Gesamtleiter PGBW	Guignard Pascal	GRUNER
Ingenieurbau	Treacy Mark	GRUNER
Architektur	Kramp Adrian	Boegli Kramp

INHALTSVERZEICHNIS

1	Ausgangslage	4
2	Durchgeführte Sachverständigenprüfungen.....	4
2.1	Bautechnik (BT), nach RL UP-EB Kap. 13.....	4
3	Bewertung durch SBB und Umsetzung der Prüfergebnisse	4
3.1	SIOP A Prüfung	4
3.2	Prüfbericht Sachverständige	5
4	Abkürzungen.....	5

1 Ausgangslage

Das Plangenehmigungsgesuch muss gemäss Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnanlagen VPVE vom 01.11.2014 (Art. 3 Abs. 2 Bst. m) eine „Stellungnahme der Gesuchstellerin zu Umsetzung der Prüfergebnisse“ beinhalten.

2 Durchgeführte Sachverständigenprüfungen

Folgende Sachverständigenprüfungen nach RL UP-EB Teil B (Kapitel 12 – 17) wurden im Fachbereich Ingenieurbau durchgeführt:

2.1 Bautechnik (BT), nach RL UP-EB Kap. 13

- SIOP A 302, Gleis- und Perronüberdachungen, Perrondächer (Dokument 12.601.09)
- Prüfbericht Sachverständige, Perondächer (Dokument 12.601.07)

3 Bewertung durch SBB und Umsetzung der Prüfergebnisse

Die Bewertung und Begründung der Prüfergebnisse durch die SBB sowie deren Umsetzung ergab für die in diesem Projekt im Ingenieurbau folgendes Ergebnis.

3.1 SIOP A Prüfung

Die Stellungnahme der Gesuchstellerin zur SIOP A Prüfung ist im Formular zur SIOP A Prüfung dokumentiert.

Stellungnahme zu Prüfbericht des Sachverständigen**3.2 Prüfbericht Sachverständige**

Prüf-Nr.	Dokument	Prüfergebnisse	Festlegung Massnahme durch Gesuchsteller	Umsetzungs-horizont	Erledigt	Erledigt im Dokument ...
Auflagen des SV Perrondach für das Auflageprojekt						
-	Statische Berechnung Perrondächer	Korrektur der Berechnung der Querzugverstärkung Ausklinkung Querträger: Resultat noch nicht korrekt im statischen Bericht, der Nachweis ist aber dennoch erfüllt.	Berechnung wurde ergänzt.	Phase Auflageprojekt	✓	Statische Berechnung Perrondächer
-	Pläne	Angaben auf den Plänen sollten entsprechend den Angaben im statischen Bericht angepasst werden.	Wurde ergänzt.	Phase Auflageprojekt	✓	Pläne Perrondächer
Empfehlungen und Auflagen des SV Perrondach für die Folgephase						
-	Nutzungsvereinbarung	Erarbeitung eines Kontroll- und Unterhaltsplans	Wird hinzugefügt.	Phase Ausführung	-	
Empfehlungen und Auflagen des SV Ingenieurbau Tragkonstruktionen für die Folgephase						
-	Statische Berechnung Fundamente	Die Fundamente weisen teils noch Reserven auf und könnten optimiert werden.	Wird weiter optimiert.	Phase Ausführung	-	
-	Statische Berechnung Fundamente	Die Bewehrungsführung in den Fundamenten ist detailliert zu planen und darzustellen, um Konflikte zu verhindern.	Wird ergänzt.	Phase Ausführung	-	

4 Abkürzungen

AP	Auflageprojekt
AS	Ausschreibung
AF	Ausführung
